

2023년 지방재정 특수공시 대상사업 내역

【기준년도 : 2022년도】

(단위 : 백만원)

연번	사업명	사업개요	총사업비	담당부서
계	15개 사업			
1	가족센터건립	공동 육아 나눔터, 상담실, 교육실, 작은 도서관, 프로그램실, 다문화 가족 교류소통공간 등	7,052 (국1,820, 특1,200, 도300, 군3,732)	주민복지과
2	순창 수체험센터 건립사업	수체험센터 건립 1동(2,904.57㎡), 온천관광자원 조성 1식	9,561 (국4,500, 특40, 도2,250, 군2,771)	건강장수과
3	섬진강 문화예술 다남길 조성 사업	한옥예촌, 섬진강 미술촌, 강변예술터, 향가소울터널 등	6,000 (국2,800, 군3,200)	문화관광과
4	강천가는 오색단풍길 조성사업	오색단풍길 10.1km, 수변쉼터, 포토존 등	4,500 (도2,250, 군2,250)	문화관광과
5	화물자동차 공영차고지 조성사업	차고지 조성 A=24,409㎡ 주차171면(특대2 대형69 소형100)	3,750 (도2,450, 군1,300)	경제교통과
6	재해위험지구 정비사업	비석지구 : 소하천정비 1km 쌍치지구 : 소하천정비 2.9km, 가동보 및 배수펌프 각 1개소 등	35,852 (국17,926, 도7,170, 군10,756)	안전재난과
7	소하천 정비사업	소하천 정비 5.4km	15,851 (군15,851)	안전재난과
8	현포교 위험교량 재가설공사	위험교량 재가설 1식 (L=32m, B=9.0m) 하천개수L=325m 진입도로 개설 L=300m	4,000 (특1,000, 조1,000, 군2,000)	건설과
9	순창읍 농촌중심지 활성화사업	복합플랫폼 두드림센터, 안전·문화 플랫폼 등 두드림 인재육성, 두드림 공동체 활성화, 배후마을 서비스 발굴 및 전달 등	16,000 (국11,200, 도1,440, 군3,360)	농촌활력과
10	강천산 다목적 주차장 조성사업	주차장 조성(A=34,000㎡), 부대시설 조성(오토캠핑장 31면)	4,500 (도3,100, 군1,400)	산림공원과
11	팔덕2단계, 풍산외모간 하수관로 정비사업	팔덕2단계 하수관로 7.3km 풍산외모간 하수관로 11.96km	21,182 (국14,483, 군6,699)	환경수도과
12	순창 공공하수처리장 증설사업	하수처리장 증설 처리용량 : 3,000㎡/일	19,355 (국5,878, 도3,341.5, 군3,341.5 기타6,794)	환경수도과
13	유기농산업복합서비스지원단지 조성사업	유기농산업 복합센터, 공공급식지원센터 등 건립	21,000 (국9,000, 특600, 도2,700, 군7,700, 기금1,000)	친환경농업과
14	참살이 발효마을 조성사업	발효테라피센터, 전통누룩체험관, 다년생식물원, 추억의 전통식품거리 조성	19,700 (국9,850, 군9,850)	장류산업 사업소
15	동계면 종합체육관 건립사업 (생활 SOC)	지상2층, 연면적 1,896.16㎡	7,070 (국2,731, 도109.5, 군4,229.5)	체육진흥 사업소

순창군 가족센터 건립사업

목 적

- 다양한 가족구성원의 욕구를 통합적으로 지원하는 서비스 공간 제공
- 여성들의 사회참여를 지원하는 지역사회 통합 커뮤니티 거점 조성

■ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 ~ 2024년
- 위 치 : 순창읍 남계리 966-12번지
- 총사업비 : 7,052백만원(국비 1,820, 특별 1,200, 도비 300, 군비 3,732)
- 사업내용
 - 상담실, 교육실, 공동 육아 나눔터, 다문화가족 교류소통관, 프로그램실, 작은도서관, 사무실 등

■ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분 재원별	총사업비	기투자	2021년	2022년	2023년이후
계(집행액)	7,052	1,333	1,446	3,621	352
국 비	1,820	580	393	847	0
특 별	1,200	0	0	1,200	0
도 비	300	100	100	100	0
군 비	3,732	953	953	1,474	352

■ 2022년까지 추진실적

- ('19. 10.) 생활 SOC복합화사업 선정
- ('20. 2.) 기본 및 실시설계용역 착수
- ('20. 12.) 위탁개발에 따른 수탁기관 선정 및 계약체결(한국자산관리공사)
- ('22. 6.) 건축물에너지효율등급 예비인증 완료
- ('22. 10.) 장애물 없는 생활환경(BF) 예비인증 완료
- ('22. 12.) 기본 및 실시설계용역 완료
- ('22. 12.) 전라북도 원가심사 완료

■ 향후 추진계획


- ('23. 1.) 공유재산 변경심의 추진
- ('23. 3.) 건축인허가 추진
- ('23. 4.) 설계안전성검토 신청
- ('23. 7.) 가족센터 건립 시공사 선정 및 계약추진
- ('23. 7. ~ '24. 12.) 가족센터 건립 공사 추진

■ 기대효과

- 가족지원 서비스를 한 곳에서 제공하는 공간 조성을 통한 다양한 가족들의 사회통합 유도

■ 관련사진 첨부

[위치도]

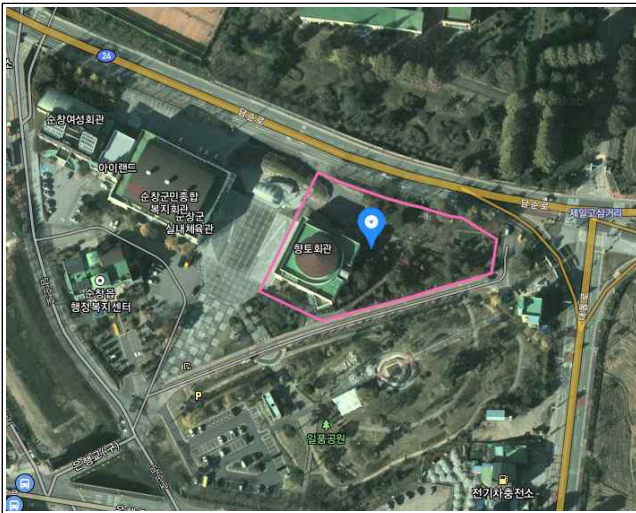

[완료전경 등]



(담당부서 : 주민복지과 여성가족친화팀 이 현 주무관 ☎ 650-1277)

순창 수체험센터 건립사업

목 적

- 음용온천수 등 천연자원을 활용 건강과 융합된 새로운 관광산업 창출
- 온천수 활용 질병예방적 차원의 스파체험 프로그램 운영으로 군민 건강증진에 기여

■ 사업개요

- 사업기간 : 2016. ~ 2022. (7년)
- 위 치 : 순창군 팔덕면 청계리 839 일원
- 총사업비 : 9,561백만원(국비 4,500, 특별 40, 도비 2,250, 군비 2,771)
- 사업내용 : 수체험센터 건립 1동(2,904.57㎡), 온천관광정원 조성 1식
- 주요시설
 - 지상 1층 : 치유누리실, 사우나실, 샤워장, 사무실, 의무실 등
 - 지상 2층 : 도반욕실, 족욕카페, 편백수면실, 미생물아토피치유실, 스낵바
 - 야외(온천관광정원) : 온천 족욕장, 노천탕, 동굴형 체험관, 산책로 등

■ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분 재원별	총사업비	기투자	2021년	2022년	2023년이후
계	9,561	9,521	40	-	-
국 비	4,500	4,500	-	-	-
특 별	40	-	40		
도 비	2,250	2,250	-	-	-
군 비	2,771	2,771	-	-	-

■ 2022년까지 추진실적

- ('17.10.) 수체험센터 건립사업 착공
- ('21.06.) 수체험센터 네이밍 공모 ('강천힐링스파'로 선정)
- ('22.03.) 수체험센터 건립사업 준공
- ('22.04.) 강천힐링스파 개장 및 운영개시

■ 기대효과

- 쉼랜드 교육프로그램 및 관광마케팅 연계 운영을 통한 관광활성화
- 성공적인 강천힐링스와 운영 및 관리에 따른 군민 건강증진 기여
- 군민 요금할인(236,669천원/년) 등에 따른 군민복지 향상

■ 관련사진 첨부

[위치도]




[완료전경]



[치유누리실]



[족욕카페]

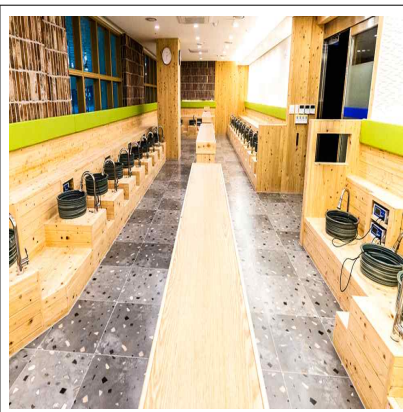

[강천음용수]



(담당부서 : 건강장수과 건강산업팀 신윤택 주무관 ☎ 650-1536)

섬진강 문화예술 다남길 조성사업

목 적

- 섬진강의 우수한 자연경관을 찾는 탐방객 수요가 매년 증가함에 따라 자연경관을 테마로 한 관광인프라 구축과 예술 체험 문화 마을 조성을 통해 건강 및 휴양의 지역브랜드를 고양시키고 지역 경제 활성화 기여

사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 위 치 : 동계 구미마을 ~ 적성 평남리 ~ 유등 오교리 ~ 풍산 향가마을
- 총사업비 : 6,000백만원(국비 2,800, 군비3,200)
- 사업내용

세부사업	주요사업현황	비고
한옥예촌(동계 구미)	마을입구 정비(한옥식 리모델링), 전시관 및 정원 등	
섬진강 미술촌(적성 구남)	전시장, 주차장, 야외갤러리, 체험 및 편의시설, 쉼터 등	
강변예술쉼터(유등 오교)	예술쉼터, 편의시설 등	
향가 소울터널(풍산 향가)	무인공방, 터널 주변 정비 등	

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분 재원별	총사업비	기투자	2021년	2022년	2023년이후
계(집행액)	6,000	2,996	1,500	1,504	-
국비	2,800	1,298	750	752	-
특별	0	-	-	-	-
도비	0	-	-	-	-
군비	3,200	1,698	750	752	-

2022년까지 추진실적

- ('15. 10.~11.) 지방재정 투자심사 완료 및 중기지방재정계획 반영
- ('18. 3.~'19. 6.) 기본 및 실시설계용역 완료
- ('19. 6.~'21. 5.) 향가 소울터널, 섬진강 미술촌(전시장 및 주차장)

- ('21. 7.) 섬진강 미술촌(전시장 내부 인테리어 및 쉼터 등), 강변예술쉼터, 한옥예촌(마을회관 한옥식 리모델링 등) 공사 착공
- ('22. 2.~6.) 한옥예촌(전시관, 한옥정원 등) 실시설계용역 완료
- ('22. 5.) 섬진강 미술관 준공
- ('22. 9.) 한옥예촌(전시관, 한옥정원 등) 공사 착공 및 강변예술쉼터 준공
- ('22. 12. 20.) 한옥예촌(마을회관 한옥식 리모델링 등) 준공

■ 향후 추진계획


- ('23. 6. 26.) 한옥예촌(전시관) 준공

■ 기대효과

- 섬진강 지역관광자원과 문화예술을 접목한 관광자원개발로 관광을 활성화하고, 주민과 관광객이 문화예술로 교류하면서 여가를 즐길 수 있는 관광명소로 발돋움

■ 관련사진 첨부

[위치도]

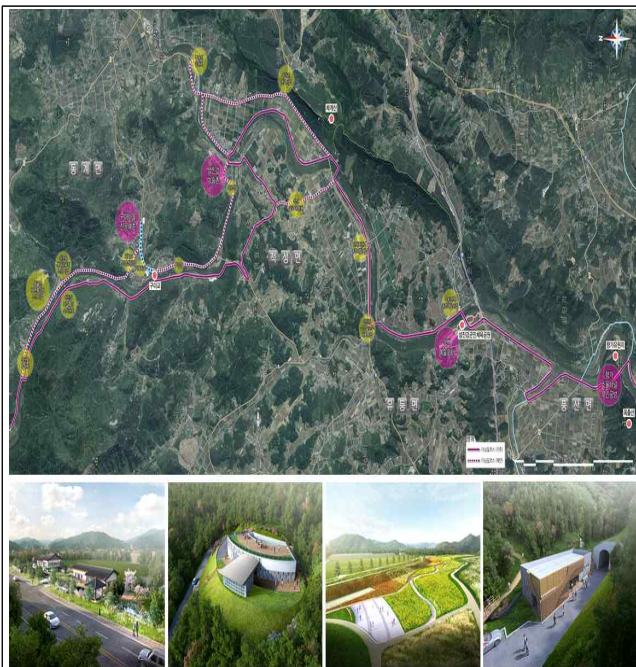

[완료전경 등]



(담당부서 : 문화관광과 관광자원개발팀 오승택 주무관 ☎ 650-1632)

강천가는 오색단풍길 조성사업

목 적

- 순창의 대표 관광지인 강천산 군립공원과 순창읍을 연계한 오색 단풍길 조성을 통해 강천산 도보 접근성 확대 및 순창읍⇄강천산 쌍방향 관광코스 개발을 통한 관광객 유치 극대화

사업개요

- 사업기간 : 2020년 ~ 2022년
- 위 치 : 순창읍 경천 ~ 팔덕면 청계리 강천산 일원
- 총사업비 : 4,500백만원(도비 2,250, 군비 2,250)
- 사업내용
 - 오색 단풍길 10.1km(데크로드, 단풍나무 식재 등), 수변쉼터, 포토존 등 조성

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분 재원별	총사업비	기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계(집행액)	4,500	400	2,000	2,100	-
국 비	0	-	-	-	-
특 별	0	-	-	-	-
도 비	2,250	200	1,000	1,050	-
군 비	2,250	200	1,000	1,050	-

2022년까지 추진실적

- ('18. 10.~11.) 중기지방재정계획 반영 및 지방재정투자심사 완료
- ('19. 5.~9.) 타당성 검토 및 기본계획 수립 완료
- ('20. 3.~9.) 강천가는 오색단풍길 실시설계 용역 착공 및 준공
- ('20. 12.~'21. 6.) 데크쉼터(7개소) 및 차량정차대(8개소) 준공
- ('21. 5.~'22. 3.) 데크산책로(600m), 전망대 등 착공 및 준공
- ('22. 4.) 데크산책로(620m), 버스환승장(3개소), 찬물내기 소공원 리모델링 등 착공
- ('22. 9.~12.) 강천가는 오색단풍길 조성사업(팔덕제 구간) 실시설계 용역 추진
- ('22. 12.) 강천가는 오색단풍길 조성사업(팔덕제 구간) 공사 착공

■ 향후 추진계획

- ('23. 7.) 강천가는 오색단풍길 조성사업(팔덕제 구간) 공사 완료


■ 기대효과

- 강천산~순창읍 경천변 주변 자원을 활용 및 연계하여 순창군을 대표하는 주요 탐방로를 조성함으로써 강천산 및 경천변의 활용 가치 제고

■ 관련사진 첨부

[위치도]

[완료전경 등]

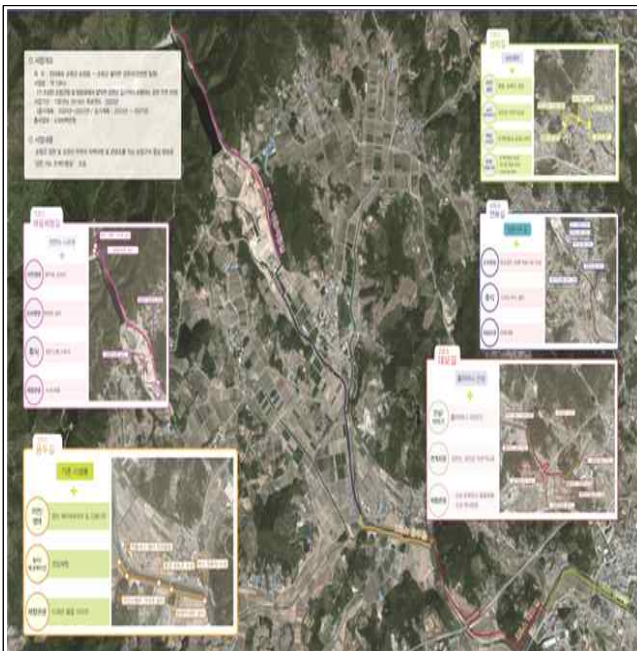

(담당부서 : 문화관광과 관광자원개발팀 오승택 주무관 ☎ 650-1632)

화물자동차 공영차고지 조성 사업

목 적

- 화물운송사업자에게 안전한 수송환경 제공
- 주택가, 도로변 밤샘주차 등 불법행위 근절로 주민 불편 해소

사업개요

- 사업기간 : 2021년 ~ 2023년
- 위 치 : 순창읍 가남리 176-1
- 총사업비 : 3,750백만원(도비2,450, 군비1,300)
- 사업내용
 - 화물자동차 차고지 조성 A=24,409m² 주차면171대(특대2 대형69 소형100)

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분 재원별	총사업비	기투자	2021년	2022년	2023년이후
계(집행액)	3,750	1,300	700	750	1,000
국 비		-			
특 별		-			
도 비	2,450	-	700	750	1,000
군 비	1,300	1,300			

2022년까지 추진실적

- (2019. 09.) 부지매입
- (2022. 03.) 착공

향후 추진계획


- (2023. 07.) 차고지 진출입구 변경(남원국토 협의)
- (2023. 11.) 전라북도 공영차고지 인가 신청
- (2023. 12.) 준공
- (2023. 12.) 화물자동차 공영차고지 운영 조례 공포

기대효과

- 대형 화물 차량 운송사업자 차고지 별도 조성에 대한 부담 경감
- 순창읍 아파트 주변 대형 차량 밤샘 주차 근절로 주민 불편 해소

관련사진 첨부

[위치도]

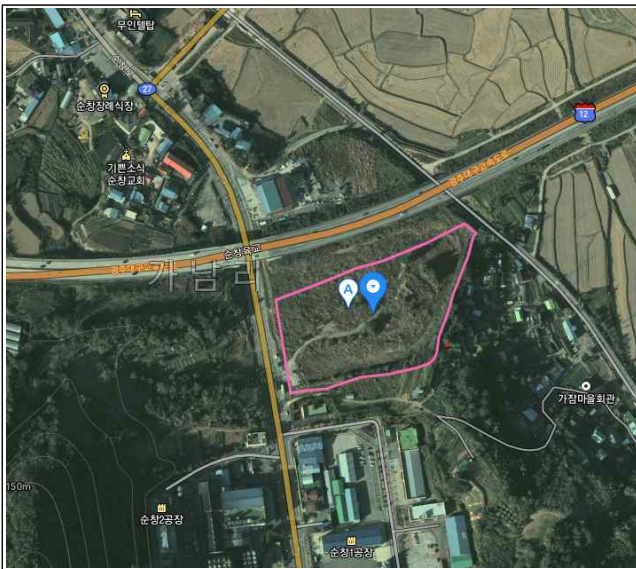

[완료전경 등]



(담당부서 : 경제교통과 교통행정팀 박선숙 주무관 ☎ 650-1338)

재해위험지구 정비사업

목 적

- 재해빈도가 높은 지역을 우선적으로 정비사업 지역주민의 재산 및 인명 피해 등 사전 재해예방

사업개요

지구명	위 치	총사업비(백만원)	사 업 량	사업기간
소계	2개소	35,852 (군 17,926, 도 7,170, 군 10,756)		
비석	북흥면 답동리	4,352 (군 2,176, 도 870, 군 1,306)	소하천정비 1.0km (비석천 0.4km, 농곡천 0.6km)	'21.~'24
쌍치	쌍치면 쌍계리	31,500 (군 15,750, 도 6,300, 군 9,450)	소하천정비 2.9km, (만석천 1.5km, 박시나무골 1.4km) 가동보 및 배수펌프 각 1개소	'21.~'25

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분 재원별	총사업비	기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계(집행액)	35,852	-	1,790	5,854	28,208
국 비	17,926	-	895	2,927	14,104
특 별	0	-			
도 비	7,170	-	358	1,171	5,641
군 비	10,756	-	537	1,756	8,463

2022년까지 추진실적

- 비석지구 : 실시설계용역 완료, 사업 착수
- 쌍치지구 : 실시설계용역 추진(관련부서 협의 등 행정절차 이행 중)

향후 추진계획

- 비석지구 : 사업 준공(2023. 12.)
- 쌍치지구 : 실시설계용역 완료(2023. 12.)


기대효과

○ 재해예방사업 추진으로 재산 및 인명 피해 등 사전 재해예방

관련사진 첨부

○ 비석지구

[위치도]

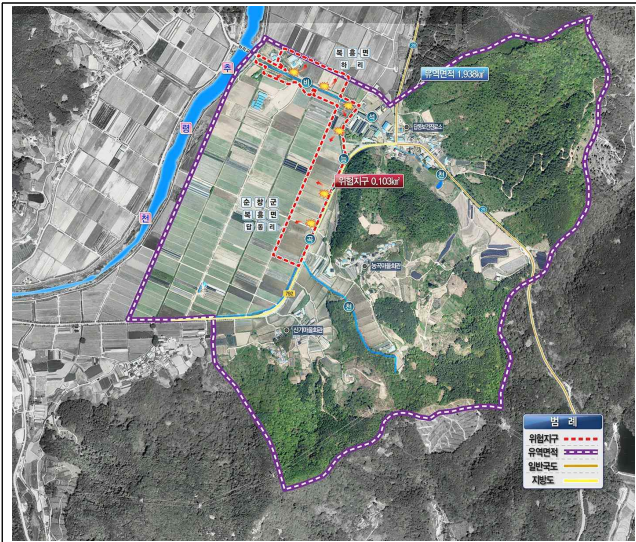

[사업 추진 중]



(담당부서 : 안전재난과 자연재난팀 김다영 주무관 ☎ 650-1877)

○ 쌍치지구

[위치도]



(담당부서 : 안전재난과 자연재난팀 최광현 주무관 ☎ 650-1864)

소하천 정비사업

목 적

- 이수 및 치수기능을 개선하여 가옥 및 농경지의 침수피해 사전 예방

■ 사업개요

- 사업기간 : 2020 ~ 2025(6개년)
- 위 치 : 인계면, 동계면, 구림면 일원
- 총사업비 : 15,851백만원(군비 15,851)
- 사업내용 : 하천 3개소(5.4km) 정비
 - 인계면 구약소하천 L=1.5km, 교량 3개소 등
 - 동계면 이동소하천 L=2.2km, 교량 5개소 등
 - 구림면 닭사리소하천 L=1.7km, 교량 9개소 등

■ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분 재원별	총사업비	기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계(집행액)	15,851	800	5,480	6,209	3,362
국 비	0				
특 별	0				
도 비	0				
군 비	15,851	800	5,480	6,209	3,362

■ 2022년까지 추진실적

- 실시설계용역 착수 및 완료 : '20. 3. ~ 21. 12.
- 닭사리소하천 정비사업 착공 : '21. 11.
- 구약소하천 정비사업 착공 : '22. 4.
- 이동소하천 정비사업 착공 : '22. 5.

■ 향후 추진계획



- 닭사리소하천 정비사업(2차분) 착공 : '23. 5.
- 구약소하천 정비사업 준공 : '23. 11.
- 이동 및 닭사리소하천 정비사업 준공 : '25. 8.

■ 기대효과

- 이.치수 개선으로 생태기능 복원 및 가옥.농경지 침수 피해 예방

■ 관련사진 첨부

[위치도]

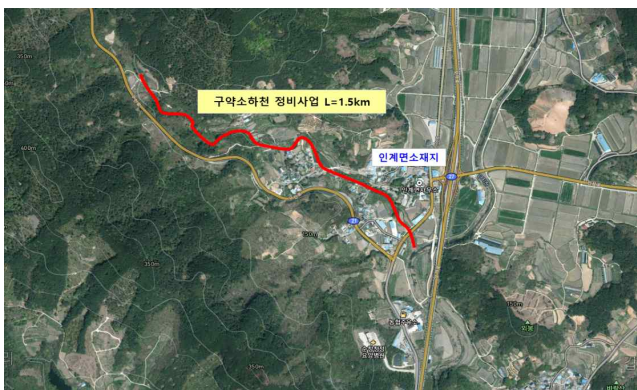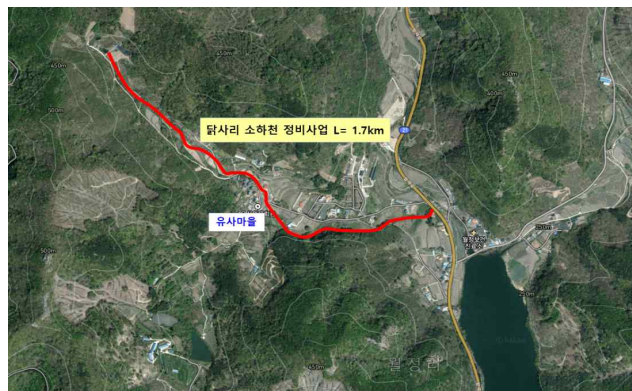

(담당부서 : 안전재난과 하천팀 권혁수 주무관 ☎ 650-1874)

동계 현포교 재사설 공사

목 적

- 동계 소재지를 연결하는 중요한 교량으로 차량 통행이 많으나 시설물 정밀안전점검 결과 E등급 재난위험시설로 진단되어 재가설 필요

■ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 1 ~ 2024. 8
- 위 치 : 순창군 동계면 현포리
- 총사업비 : 4,000백만원(특별 1,000 조정 1,000 군비2,000)
- 사업내용
 - 위험교량 재가설 1식(L=32m, B=9.0m)
 - 하천개수 L=325m, 진입도로 개설 L=300m

■ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분 재원별	총사업비	기투자	2021년	2022년	2023년이후
계(집행액)	4,000	-	1,000	2,000	1,000
국 비	0	-			
특 별	1,000	-	1,000		
조 정	1,000	-		1,000	
군 비	2,000	-		1,000	1,000

■ 2022년까지 추진실적

- (2020. 10. 19 ~ 2021. 12. 23) 실시설계용역
- (2022. 02. 24) 지방재정투자심사
- (2022. 04. 27) 도로교통공단 기술자문
- (2022. 11. 25) 도로구역 결정(변경) 및 사업인정에 관한 주민 등의 의견청취 공고
- (2022. 12. 26) 공사 착공

■ 향후 추진계획

○ (2022. 12. 26 ~ 2024. 08. 23) 사업추진 및 준공

■ 기대효과

○ 동계면 소재지를 통과하는 핵심 도로 기반 확충을 통해 주민의 기본적인 통행권 확보

■ 관련사진 첨부

[위치도]



[착공 전경 등]



(담당부서 : 건설과 도로시설팀 구규남 팀장 ☎ 650-1815)

순창읍 농촌중심지활성화사업

목 적

- 농어촌지역의 거점공간인 면 중심지에 교육, 문화, 복지시설 등 주민이 이용 가능한 적정 수준의 시설을 갖추으로써 거점기능 강화 및 기초 서비스 기능 향상 도모

사업개요

- 사업기간 : 2021. 7. ~ 2025. 12.
- 위 치 : 순창군 순창읍 순화리, 남계리 일원
- 총사업비 : 16,000백만원(국비 11,200, 도비 1,440, 군비 3,360)
- 사업내용
 - H/W분야 : 복합플랫폼 두드림센터, 서비스 접근가로 안전·문화 플랫폼 등
 - S/W분야 : 두드림 인재육성, 두드림 공동체 활성화 배후마을 서비스 발굴 및 전달 등

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분 재원별	총사업비	기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계(집행액)	16,000	4,467	4,206	3,716	3,611
국 비	11,200	3,127	2,944	2,601	2,528
특 별	0	-	-	-	-
도 비	1,440	402.1	379	334	324.9
군 비	3,360	937.9	883	781	758.1

2022년까지 추진실적

- ('21. 04.) 순창군 농촌공간 전략계획 수립
- ('21. 06.) 순창군 농촌생활권 활성화계획 수립
- ('21. 07.) 농식품부 - 순창군 농촌협약 체결
- ('21. 10.) 순창군 - 한국농어촌공사 전북본부 업무협약 체결
- ('21. 11.) 순창군 - 한국농어촌공사 순창지사 위수탁계약 체결
- ('22. 03.) 기본계획 수립 용역 착수
- ('22. 06.~'23. 12.) 주민위원회 구성 및 회의 추진(위원회 9회, 워크숍 2회)
 - ※ 사업내용(서비스 전달센터 → 사업 삭제) 변경에 따른 협의 지연

■ 향후 추진계획

- ('23. 05.) 기본계획 농식품부 승인(조건부)
- ('23. 07.) 기본계획 승인 고시
- ('23. 08.~ '24. 03) 시행계획 수립용역 추진
- ('24. 04.) 시행계획 승인 및 고시
- ('24. 05.) 사업착공
- ('25. 12.) 사업 준공 및 정산

■ 기대효과

- 농촌중심지로서 서비스를 공급하기 위한 기반시설을 확보하여 타 면 지역의 서비스 수요를 수용함과 동시에 서비스 공급을 수행할 수 있는 역량 확보

■ 관련사진 첨부



(담당부서 : 농촌활력과 소도읍개발팀 오병욱 주무관 ☎ 650-1766)

강천산 다목적 주차장 조성사업

목 적

- 성수기 주차장 부족문제 해결을 통하여 관광편의 제공 및 만족도 향상

사업개요

- 사업기간 : 2020년 ~ 2022년
- 위 치 : 순창군 팔덕면 강천산군립공원 일원
- 총사업비 : 4,500백만원(도비 3,100, 군비1,400)
- 사업내용
 - 주차장 조성(A=34,000m²), 오토캠핑장 31면 조성

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분 재원별	총사업비	기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계(집행액)	4,500	1,500	1,600	1,400	-
국 비	0	-			
특 별	0	-			
도 비	3,100	1,000	1,050	1,050	-
군 비	1,400	500	550	350	-

2022년까지 추진실적

- 강천산 다목적 주차장 조성사업 준공('21. 12.)
- 강천산 다목적 주차장 오토캠핑장(관리동) 신축공사 준공('22. 12.)
- 강천산 다목적 주차장 오토캠핑장(관리동 전기공사) 준공('22. 12.)

향후 추진계획

- 강천산 다목적 주차장 오토캠핑장(토목공사) 준공('23. 9.)
- 강천산 다목적 주차장 오토캠핑장(전기공사) 준공('23. 10.)

기대효과

- 성수기 주차문제를 해결하고 오토캠핑장 운영으로 강천산군립공원 탐방객 증대를 도모하여 지역경제 활성화를 도모하고자함.

관련사진 첨부

[위치도]



[완료전경 등]



(담당부서 : 산림공원과 공원관리팀 소경록 주무관 ☎ 650-5543)

팔덕2단계, 풍산외모간 하수관로 정비사업

목 적

- 마을에서 발생하는 생활오수를 공공하수처리장에 유입 후 적정 처리하여 하천 수질 개선 및 주민 보건 환경 개선

사업개요

사업명	위치	사업내용	총사업비 ('23년예산)	사업기간
3개사업			21,182 (7,925)	
팔덕지구 2단계	팔덕 7개 마을 (청계, 백암, 장재, 통천, 신평, 입석, 용두)	하수관로 7.3km 배수설비 288가구	6,294 (0)	'20~'23년
풍산 외모간	금과 4개 마을, 풍산 7개 마을 금과(대장, 동전, 발산, 수양) 풍산(순정, 함촌, 회덕, 유정, 반월, 월명)	하수관로 11.96km 배수설비 470가구	14,738 (7,775)	'20~'23년
백암마을	팔덕면 백암마을 (※주민참여예산)	하수관로 0.8km 배수설비 5가구	150 (150)	'23년

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분 재원별	총사업비	기투자	2021년	2022년	2023년이후
계(집행액)	21,182	2,069	2,143	8,333	8,637
국 비	14,483	2,000	1,398	5,672	5,413
특 별	0	-	-	-	
도 비	0	-	-	-	
군 비	6,699	69	745	2,661	3,224

2022년까지 추진실적

- 팔덕지구 2단계 하수관로 정비사업
- ('21. 6.) 1차분 하수관로 매설 3km 완료
 - ('22. 10.) 2차분 하수관로 매설 3.1km 완료
 - ('22. 11.) 3차분 하수관로 매설 1.2km 착공

- 풍산 외모간 하수관로 정비사업
 - ('21. 12.) 1차분 하수관로 매설 1.4km 완료
 - ('22. 8.) 2차분 하수관로 매설 3.6km 완료
 - ('22. 10.) 3차분 하수관로 매설 3.2km 착공
- ('23. 1.) 백암마을 하수관로 정비사업 착공

■ 향후 추진계획


- ('23. 7.) 팔덕지구 2단계 하수관로 정비사업(3차분) 준공
- ('23. 7.) 백암마을 하수관로 연결사업 준공
- ('23. 12.) 풍산 외모간 하수관로 정비사업(3차분) 준공

■ 기대효과


- 하수와 분뇨를 적정하게 처리하여 지역사회에 지속가능한 발전과 공중위생의 향상에 기여

■ 관련사진 첨부

[위치도](팔덕지구 2단계)

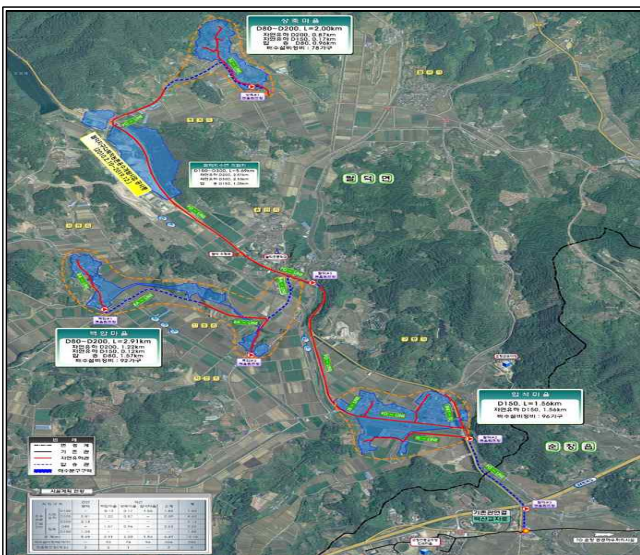

[위치도](풍산 외모간)

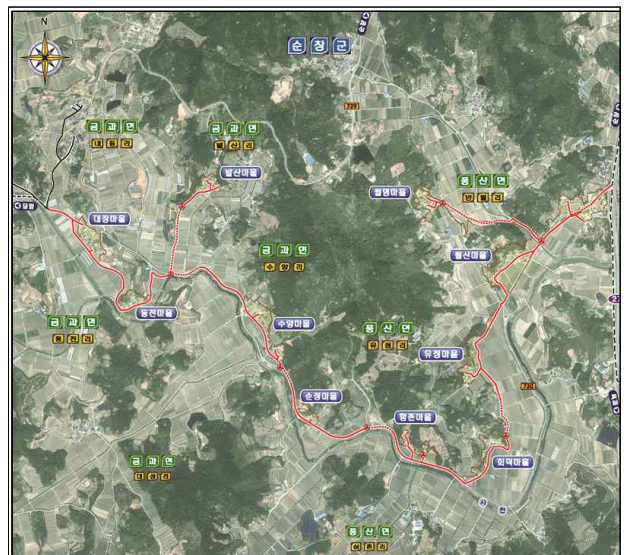

(담당부서 : 환경수도과 하수도팀 김학명 팀장, 김민수 주무관 ☎ 650-1715, 650-1743)

순창 공공하수처리장 증설사업

목 적

- 마을에서 발생하는 생활오수를 공공하수처리장에 유입 후 적정 처리하여 하천 수질 개선 및 주민 보건 환경 개선

사업개요

- 사업기간 : 2019 ~ 2025년(6년)
- 위 치 : 유등면 향가로 65
- 총사업비 : 19,355백만원(국비 5,878, 도비 3,341.5, 군비 3,341.5, 기타 6,794)
- 사업내용 : 처리용량 3,000m³/일 증설

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분 재원별	총사업비	기투자	2021년	2022년	2023년이후
계(집행액)	19,355	950	-	1,817	16,588
국 비	6,381	324	-	654	5,403
도 비	3,341.5	162	-	327	2,852.5
군 비	3,341.5	464	-	327	2,550.5
원인자부담금	6,794	-	-	509	6,285

2022년까지 추진실적

- ('22. 4.) 환경청 재원협의 완료
- ('22. 7.) 전북도 설치인가 완료
- ('22. 11.) 조달청 원가심사 완료
- ('23. 3.) 1차분 공사 착공

향후 추진계획


- ('23. 12.) 1차분 공사 완료

기대효과


- 하수와 분뇨를 적정하게 처리하여 지역사회에 지속가능한 발전과 공중위생의 향상에 기여

관련사진 첨부

[위치도]

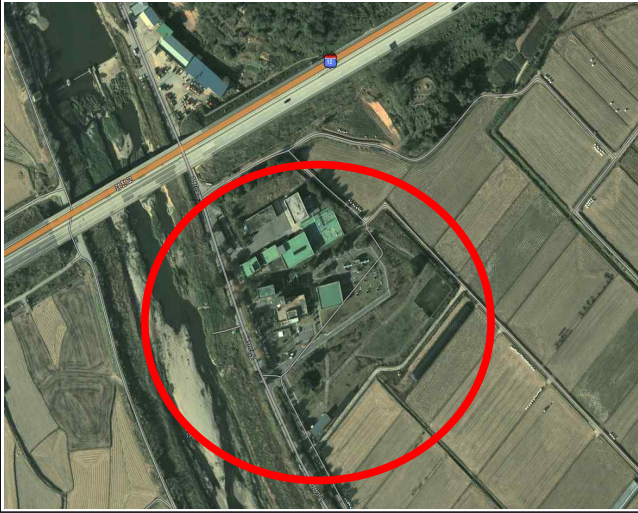

[계획평면도]

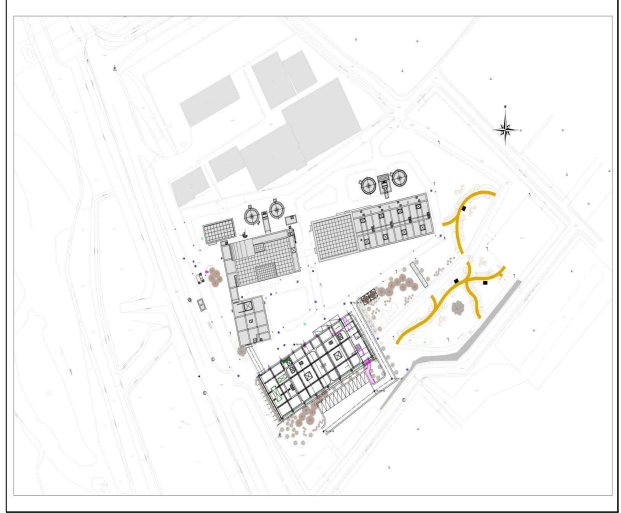

(담당부서 : 환경수도과 하수도팀 김학명 팀장 ☎ 650-1715)

유기농산업 복합서비스 지원단지 조성사업

목 적

- 유기농을 주제로한 체험·힐링 공간을 조성하여 순창군 친환경농업 위상 제고
- 가공 창업 공간 마련으로 유기농 신소득분야 창출 및 지역경제 활성화

■ 사업개요

- 사업기간 : 2020 ~ 2024(5개년)
- 위 치 : 순창군 순창읍 백산리 586 일원(발효테마파크 내)
- 총사업비 : 210억(국비 90, 특별 6, 도비 27, 군비 77, 기금 10)
- 사업내용 : 유기농산업 복합센터, 공공급식지원센터 등 구축

■ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분 재원별	총사업비	기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계(집행액)	21,000	-	556	3,111	17,333
국 비	9,000	-	278	1,556	7,166
특 별	600	-	0	600	0
도 비	2,700	-	83	466	2,151
군 비	7,700	-	195	489	7,016
기 금	1,000	-	0		1,000

■ 2022년까지 추진실적

- ('20. 10.) 유기농산업 복합센터 조성 농림부 기본계획 승인
- ('20. 10.) 공공건축 심의 위원회 검토완료 및 기본, 실시설계 공모
- ('21. 3. ~ 22. 5.) 기본 및 실시설계 용역 추진
- ('21. 7.) 농림부 기본계획 최종 승인
- ('22. 4.) 전라북도 시행계획 최종 승인
- ('22. 5.) 기본 및 실시설계 용역 완료
- ('22. 5.) 조달청 원가심사 및 계약 의뢰
- ('22. 6. ~ '22. 8.) 건축(1차분)·전기·소방·통신 공사 착공 및 감리용역 착수
- ('22. 10. ~ '22. 12.) 부지평탄화 및 기초파일공사 추진, 동절기 공사 일시정지

■ 향후 추진계획

- ('23. 3. ~ '24. 3.) 동절기 공사 일시정지 해지 및 조성사업 추진
- ('23. 6.) 건축공사 1차 준공('23. 6. 11.) 및 건축공사 2차 착공('23. 6. 20.)
- 순창군 유기농산업 복합센터 조성 실무협의회 및 자문위원회 운영 : 6회(연중)
- ('23. 7. ~ '23. 12.) 생산·운영 조직체 육성 및 위탁업체 유치
- ('23. 9.) 실내인테리어 실시설계 추진
- ('23. 10.~'23. 12.) 유기농산업 복합센터 운영 관련 조례 제정
- ('24. 3.) 유기농산업 복합센터 조성사업 준공

■ 기대효과

- 유기농산물 생산·유통·소비 체계 확립으로 유기농업 활성화
- 유기농업, 유통·가공 산업, 농촌체험을 통한 농업분야의 새로운 비전 제시

■ 관련사진 첨부

[위치도]



[완료전경 등]



(담당부서 : 친환경농업과 기술보급팀 제지영 주무관 ☎ 650-5623)

참살이 발효마을 조성사업

목 적

- 순창장류산업은 국내 장류 총생산의 36%를 차지하고 있으나, 산업위주의 성장으로 중장기 성장동력 한계
- 문화, 관광의 융복합화를 통해 전통식품산업의 활성화와 농업소득 증가, 고용 창출을 연계함으로써 전통발효문화산업의 거점 조성

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017년 ~ 2022년
- 위 치 : 전북 순창군 순창읍 백산리(투자선도지구 일원)
- 총사업비 : 19,700백만원(국비 9,850, 군비 9,850)
- 사업내용 : 발효테라피센터, 전통누룩체험관, 다년생식물원, 추억의 전통식품거리 조성

■ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분 재원별	총사업비	기투자	2021년	2022년	2023년이후
계(집행액)	19,700	7,870	11,830	0	0
국 비	9,850	3,935	5,915	0	0
군 비	9,850	3,935	5,915	0	0

■ 2022년까지 추진실적

- 서부내륙권광역관광개발계획 기본계획 수립 : '15. 04.
- 단지조성 설계용역 착수 : '17. 04
- 참살이발효마을 기본계획 수립 착수 : '17. 11
- 참살이발효마을 마케팅전략 및 시설운영계획 용역 발주: '17. 12
- 공공건축 사업계획 사전검토 의뢰 : '18. 05
- 기본 및 실시설계용역 원가심사 의뢰 : '18. 10

- 참살이발효마을 건축설계 공모 : '18. 10
- 참살이발효마을 건축설계 공모 업체선정 : '18. 12
- 기본 및 실시설계 용역 착수 : '19. 01
- 기본 및 실시설계 용역 완료 : '19. 12
- 조달청 설계 적정성 검토 완료 : '20. 04
- 전라북도 건설기술심의 완료 : '20. 05
- 참살이발효마을 공사착공 : '20. 08
- 사업계획 변경 승인(사업기간 등) : '21. 10
- 다년생식물원 준공 : '22. 03
- 다년생식물원 관리위탁 : '22. 05
- 발효테라피센터, 전통누룩체험관, 추억의 전통식품거리 준공 : '23. 02
- 발효테라피센터, 전통누룩체험관, 추억의 전통식품거리 관리위탁 : '23. 04~05

■ 향후 추진계획

- 지속 운영 : '23. 6~

■ 기대효과

- 산업과 관광이 융합된 단지 조성으로 지역경제 활성화, 500만 관광객 유치

■ 관련사진 첨부

[조감도]



[전경사진]



(담당부서 : 장류산업사업소 장류산업계 조동진 주무관 ☎ 650-5434)

동계 종합체육관 건립사업(생활 SOC)

목 적

- 군민들에게 체육, 보건, 문화 등 복합공간 제공으로 건전한 여가와 체육복지 실현을 통한 삶의 질 향상에 기여

■ 사업개요

- 사업기간 : 2020~2024
- 위 치 : 동계면 현포리 520번지 일원
- 총사업비 : 7,070백만원(국비 2,731, 도비 109.5, 군비 4,229.5)
- 사업내용 : 지상2층, 연면적 1,896.16㎡

■ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분 재원별	총사업비	기투자	2021년	2022년	2023년이후
계(집행액)	7,070	2,500	2,060	2,460	50
국 비	2,731	900	1,156	650	25
도 비	109.5	51	51	-	7.5
군 비	4,229.5	1,549	853	1,810	17.5

■ 2022년까지 추진실적

- 부지매입(1필지, 4,071㎡) 완료 : 2019. 12.
- 위.수탁 계약 체결(한국자산관리 공사) : 2020. 12.
- 설계용역 착수 : 2021. 6.
- 건축 인.허가 완료 : 2023. 5.
- 업체 선정 및 계약 완료 : 2023. 6.

■ 향후 추진계획

- 사업 착공 : 2023. 7.
- 사업 준공 : 2024. 8.

기대효과

- 지역주민을 위한 다양한 체육시설 문화혜택을 제공하여 지역문화 발전에 기여

관련사진 첨부

[위치도]



[현장사진]



(담당부서 : 체육진흥사업소 체육시설팀 신대근 주무관 ☎ 650-5525)
